

		Код	
		0322001	
ИНВЕТОР	Форма по ОКУД по ОКПО		
<i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>			
МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, факт. Адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б, ИНН 6367061249 / КПП 636701001			
ЗАКАЗЧИК	по ОКПО		
<i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>			
ООО "ССК-Эдем" Юр. адрес: Самарская область, Волжский район, мкр-н Южный город, ул. Луговая, д. 9, кв. 8, ИНН 6330071096 / КПП 633001001			
ПОДРЯДЧИК	по ОКПО		
<i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>			
СТРОЙКА	Электрика - кор		
<i>(наименование, адрес)</i>			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
		номер	
		дата	
Вид операции			
		Отчетный период	
		с	по
Номер документа	Дата составления		
ФЗ-1	21/09/2018	17/09/2018	21/09/2018


СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :					
1	Электрика - кор	АКТ-1	83334,28	83334,28	83334,28
	Итого		83334,28	83334,28	83334,28
	Сумма НДС		15000,17	15000,17	15000,17
	Всего с учетом НДС		98334,45	98334,45	98334,45

Сдал директор ООО "ССК-Эдем"

Принял и.о. руководителя МБУ "УГЖКХ"

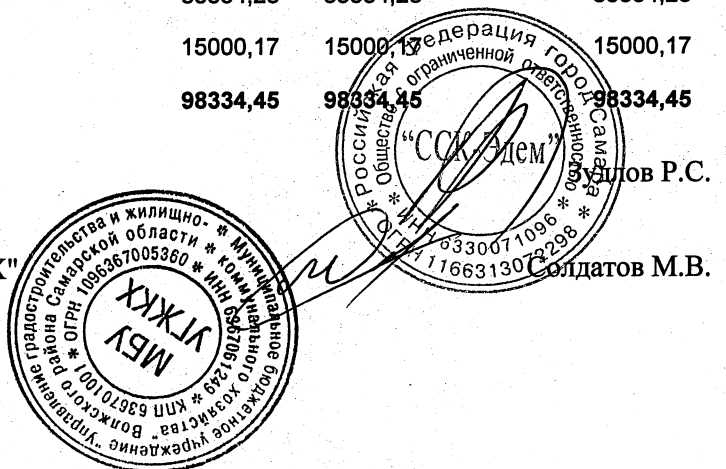

		Код
		0322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКПД по ОКПО
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, факт. Адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б, ИНН 6367061249 / КПП 636701001	по ОКПО
Подрядчик	ООО "ССК-Эдем" Юр. адрес: Самарская область, Волжский район, мкр-н Южный город, ул. Луговая, д. 9, кв. 8, ИНН 6330071096 / КПП 633001001	по ОКПО
Стройка	Благоустройство общественной территории в парке Победы с. Черновский (наименование, адрес)	
Объект	Благоустройство общественной территории в парке Победы с. Черновский (наименование)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		дата
		Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	21/09/2018	17/09/2018	21/09/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 98 334,45 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электрика							
1	1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	01-11-028-01	1 линия	2	96,71	193,42
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,32	304,93	97,58
		Электромонтажник-наладчик 6 разряда	0-3306				
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,32	299,50	95,84
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	2-0023				
2	2	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободстоящих одноствоечных, одноцепных объемом до 2 м3	33-01-008-01	1 м3 опор	0,75	23 522,37	17 641,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,55	237,40	1 317,57
		Рабочий строитель среднего разряда 4,3	1-1043				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,9875	281,83	560,14
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	021143	маш.-ч	0,375	1 249,93	468,72
		Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	040202	маш.-ч	0,075	137,15	10,29
		Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные)	160202	маш.-ч	0,6075	757,97	460,47
		Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	160601	маш.-ч	1,005	1 407,84	1 414,88
		Спецавтомшины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы	400311	маш.-ч	0,3525	2 166,67	763,75
		Электроды диаметром 4 мм Э42	101-1513	т	0,000038	122 015,60	4,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	204-0004	т	0,00075	35 776,64	26,83
		Стойка железобетонная	403-2381	м3	0,7575	17 082,66	12 940,11
		центрифугированная ВЛ и ОРУ					
		Смесь песчано-гравийная природная	408-0200	м3	0,225	1 042,50	234,56
3	3	Болты с гайками и шайбами строительные	101-1714	т	0,024	87 610,78	2 102,66
4	4	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ - прим. (Стойка СНВ 10.5)	110-0255	т	1,15	38 551,06	44 333,72
5	5	Заземление оборудования местное	08-05-045-04	1 шт.	5	1 667,16	8 335,86
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	21,65	219,24	4 746,55
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,7	1-2037				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	0,5	70,93	35,47
		Вагонетки шахтные 3,3 м3	263403	маш.-ч	2,05	35,49	72,75
		Дрели электрические	330206	маш.-ч	0,2	15,01	3,00
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	400003	маш.-ч	2,3	1 292,14	2 971,92
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	5,25	7,65	40,16
		Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	101-0426	т	0,002965	61 277,67	181,69
		Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	101-2210	т	0,00375	72 224,21	270,84
		Электроды УОНИ 13/45	101-3995	кг	0,11	95,10	10,46
		Лак БТ-577	113-0079	т	0,00006	50 297,81	3,02
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	27,84		6 257,54
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,9875		560,14
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	29,8275		6 817,68
		Стоимость эксплуатации машин					6 201,25
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					13 712,31
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					46 436,38
		Стоимость материалов					60 148,69
		Итого прямые затраты по разделу					72 607,48
		Накладные расходы в том числе:					6 606,54
		Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 1877,71	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				1 971,60
		Пусконаладочные работы 65% от ФОТ текущего 193,42	МДС 81-33.2004 прил.4 п.48				125,72
		Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 4746,55	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				4 509,22
		Сметная прибыль					4 120,26
		в том числе:					
		Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 1877,71	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим.п.1				957,63
		Пусконаладочные работы 40% от ФОТ текущего 193,42	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.48				77,37
		Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 4746,55	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				3 085,26
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					83 334,28
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	27,84		6 257,54
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,9875		560,14
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	29,8275		6 817,68
		Стоимость эксплуатации машин					6 201,25
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					13 712,31
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					46 436,38
		Стоимость материалов					60 148,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты по акту					72 607,48
		Накладные расходы					6 606,54
		в том числе:					
		Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 1877,71	МДС 81-33.2004 прил.4 п.27				1 971,60
		Пусконаладочные работы 65% от ФОТ текущего 193,42	МДС 81-33.2004 прил.4 п.48				125,72
		Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 4746,55	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2				4 509,22
		Сметная прибыль					4 120,26
		в том числе:					
		Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 1877,71	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим.п.1				957,63
		Пусконаладочные работы 40% от ФОТ текущего 193,42	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.48				77,37
		Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 4746,55	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2				3 085,26
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					83 334,28
		Налоги					
		НДС 18%					15 000,17
		Итого					98 334,45
		ВСЕГО ПО АКТУ					98 334,45

Сдал директор ООО "ССК-Эдем"

Принял и.о. руководителя МБУ "УГЖКХ"

Зудлов Р.С.

Солдатов М.В.

