

ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Нижний Новгород		БИК	042202847
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000847
ИНН 6312197586	КПП 631201001	Сч. №	40702810423000049797
ООО "Морган-Инжиниринг"			
Получатель			

Счет на оплату № 52 от 03 ноября 2021 г.

Поставщик **ООО "Морган-Инжиниринг", ИНН 6312197586, КПП 631201001, 443031, Самарская (Исполнитель) обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3**

Покупатель **УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области (Заказчик): л/с 933080040; 93309004), ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120**

Основание: **Муниципальный контракт № 39 от 21.09.2021**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский. Территория, прилегающая к зданию ДК п.Просвет. Устройство клумбы общественной территории."		шт	256 534,97	256 534,97

Итого: **256 534,97**
Сумма НДС 20%: **51 306,99**
Всего к оплате: 307 841,96

Всего наименований 1, на сумму 307 841,96 руб.


Триста семь тысяч восемьсот сорок один рубль 96 копеек

Руководитель _____

П.И. Менделеев А. В.

Бухгалтер _____

Пименов А. В.



Счет-фактура № 70 от 03 ноября 2021 г.
 Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Морган-Инжиниринг" (6)
 Адрес: 443031, Самарская обл, Самарга г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3 (6а)
 ИНН/КПП продавца: 6312197586/631201001 (6б)
 Грузополучатель и его адрес: -- (7)
 Грузоотправитель и его адрес: -- (7)
 К платежно-расчетному документу № -- от -- (8)
 Документ об отгрузке № п/л 1 №36 от 30.09.2021 г.

УФК по Самарской области (МБУ "УГ ЖКХ" Волжского района Самарской области л/с 933080040; 93309004)

Адрес: 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120 (6а)
 ИНН/КПП покупателя: 6367061249/636701001 (6б)
 Валюта, наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	
											цифровой код	краткое наименование		
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	
1	Выполнение работ по объекту "Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский, Территория, прилегающая к зданию ДК п.Просвет. Устройство клубы общественной территории."	--	--	--	--	256 534,97	без акциза	20%	51 306,99	307 841,96	--	--	--	
Всего к оплате (9)											X	51 306,99	307 841,96	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Пименов А. В.
 (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Пименов А. В.
 (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реализовано сдельно о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ИНВЕТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
	по ОКПО	60264627	
	по ОКПО	39299707	
ЗАКАЗЧИК <i>(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)</i>	МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		
ПОДРЯДЧИК <i>(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)</i>	ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827		
СТРОЙКА <i>(наименование, адрес)</i>	Устройство клумбы общественной территории «Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет»		
Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	№ 39
		дата	21.09.2021г
		Вид операции	
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
Ф3-1	03/11/2021	с	по
		21/09/2021	03/11/2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:					
1	Устройство клумбы общественной территории	Акт №1	256 534,97	256 534,97	256534,97
	Итого		256 534,97	256 534,97	256534,97
	Сумма НДС 20%		51306,99	51306,99	51306,99
	Всего к учету		307841,96	307841,96	307 841,96

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И.о. руководителя

С.А.Назаров

Подрядчик (субподрядчик) Директор

А.В.Пименов

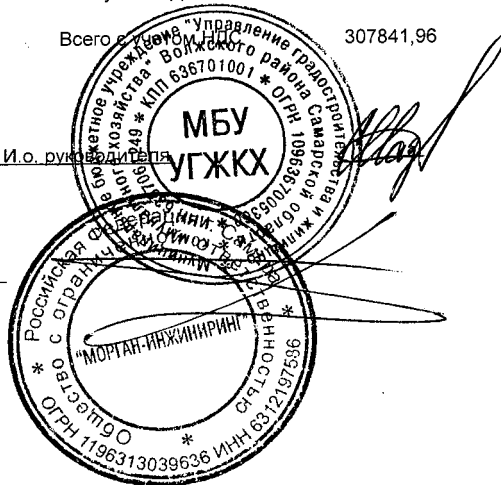

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)			
	МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120,		60264627	
ЗАКАЗЧИК	(генподрядчик) Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)			
ПОДРЯДЧИК	ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3	по ОКПО	39299707	
	Телефон: 89171012827			
	(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА	«Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет»			
	(наименование, адрес)			
ОБЪЕКТ	Устройство клумбы общественной территории			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	№ 39	
		дата	21.09.2021г	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	03/11/2021	21/09/2021	03/11/2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 307841,96 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Клумба					
1	1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	69-19-1	м3	28,27	244,17 83,08	6902,69 2348,68
2	2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	27-03-010-02	100 м	0,22	453,13 453,13	99,69 99,69
3	3	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	71,445	3,28	234,34
4	4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	03-21-01-035	1 т груза	71,445	21,26	1518,92
5	5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0.65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	01-01-013-08	1000 м3	0,021	3111,64 76,75	65,34 1,61
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	03-21-01-035	1 т груза	39,9	21,26	848,27
7	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н=0,2м	27-04-001-01	100 м3	0,21	3390,48 115,49	712 24,25

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм -до 5% по массе	02.3.01.02-0 013	м3	21,42	45,92	983,61
9	9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Н=0,15м	27-04-001-04	100 м3	0,1577	<u>5459,07</u> 173,23	<u>860,9</u> 27,32
10	10	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	16,085	91,50	1471,78
11	11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,33	<u>4353,58</u> 590,51	<u>1436,68</u> 194,87
12	12	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	22	22,36	491,92
13	13	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	05.2.03.03-0 032	шт	11	63,12	694,32
14	14	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	27-07-006-01	1000 м2	0,08442	<u>4546,32</u> 170,56	<u>383,8</u> 14,4
15	15	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,055	1690,00	92,95
16	16	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	04.2.01.01-0 056	т	16,884	479,83	8101,45
Прямые затраты по разделу "Клумба" с учетом коэффициентов							<u>24898,66</u>
							2711
Накладные расходы							2480,12
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=450			МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				638,93
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=10			МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				9,22
Прочие ремонтно-строительные работы 78% от ФОТ=2349			МДС 81-33.2004 прил.5 п.19				1831,97
Сметная прибыль							1542,97
Автомобильные дороги 81% от ФОТ=450			Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				364,46
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ=10			Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				4,17
Прочие ремонтно-строительные работы 50% от ФОТ=2349			Письмо АП-5536/06 прил.2 п.19				1174,34
Итого по разделу "Клумба"							28921,75
Фундаменты							
17	17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	01-02-057-02	100 м3	0,058	<u>1201,20</u> 1201,20	<u>69,67</u> 69,67
18	18	Устройство бетонной подготовки	06-01-001-01	100 м3	0,0016	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>5,65</u> 1,68
19	19	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	0,1632	592,76	96,74
20	20	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	06-02-001-05	100 м3	0,0051	<u>7534,28</u> 2564,28	<u>38,42</u> 13,08
21	21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	04.1.02.05-0 009	м3	0,51765	725,69	375,65
22	22	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	08.4.03.03-0 030	т	0,00765	8102,64	61,99
23	23	Засыпка вручную траншей, пазух	01-02-061-01	100 м3	0,0767	<u>663,75</u>	<u>50,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
		котлованов и ям, группа грунтов:				663,75	50,91
		1					
24	24	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм -до 5% по массе	02.3.01.02-0 013	м3	7,7467	45,92	355,73
		Прямые затраты по разделу "Фундаменты" с учетом коэффициентов					1054,76
		Накладные расходы					113,74
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=16	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				17,28
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=121	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				96,46
		Сметная прибыль					54,87
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ=16	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				9,05
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ=121	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				45,82
		Итого по разделу "Фундаменты"					1223,37
		Итого прямые затраты по акту					25953,42
		Накладные расходы					2593,86
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=450	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				638,93
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=16	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				17,28
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=10	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				9,22
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=121	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				96,46
		Прочие ремонтно-строительные работы 78% от ФОТ=2349	МДС 81-33.2004 прил.5 п.19				1831,97
		Сметная прибыль					1597,84
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=450	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				364,46
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ=16	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,				9,05
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ=10	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				4,17
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ=121	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2,				45,82
		Прочие ремонтно-строительные работы 50% от ФОТ=2349	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.19				1174,34
		Итого по акту					30145,12
		Инд.изм. сметной стоимости на 1 квартал 2021г. СМР 8,51, Оборудование 4,51, Прочие 11,95 Письмо Минстроя РФ от12.02.2021г №5363 Налоги					256534,97

